

平成22年度 主要工事進捗状況


(平成22年5月31日現在)

工事番号	工事件名	工事箇所	契約金額	契約者	工期	出来高	主な工種の進捗状況
平成20年度 第704号	都市計画道路補助第264号線 (三和橋付近) 橋梁架替 (その6) 工事	細田二丁目 2番先から	803,250,000	㈱フジタ	H20.10.20	54.2%	1) 準備、片付工 50.0%
		細田三丁目 2番先まで			H23.4.13		2) 作業ヤード整備工 40.0%
平成21年度 第703号	都市計画道路補助第330号線 整備(その2) 工事	東新小岩一丁目18番先から	239,925,000	大林道路㈱	H21.10.5	22.1%	1) 準備、片付工 50.0%
		東新小岩一丁目7番先まで			H23.2.1		2) 電線共同溝工 40.2%
							3) 排水施設工 25.9%
							4) 舗装工 12.8%
							5) 交通安全施設工 1.1%
							6) 植栽工 12.7%

資料
No. 9
都市整備部

平成22年6月10日

工事箇所図

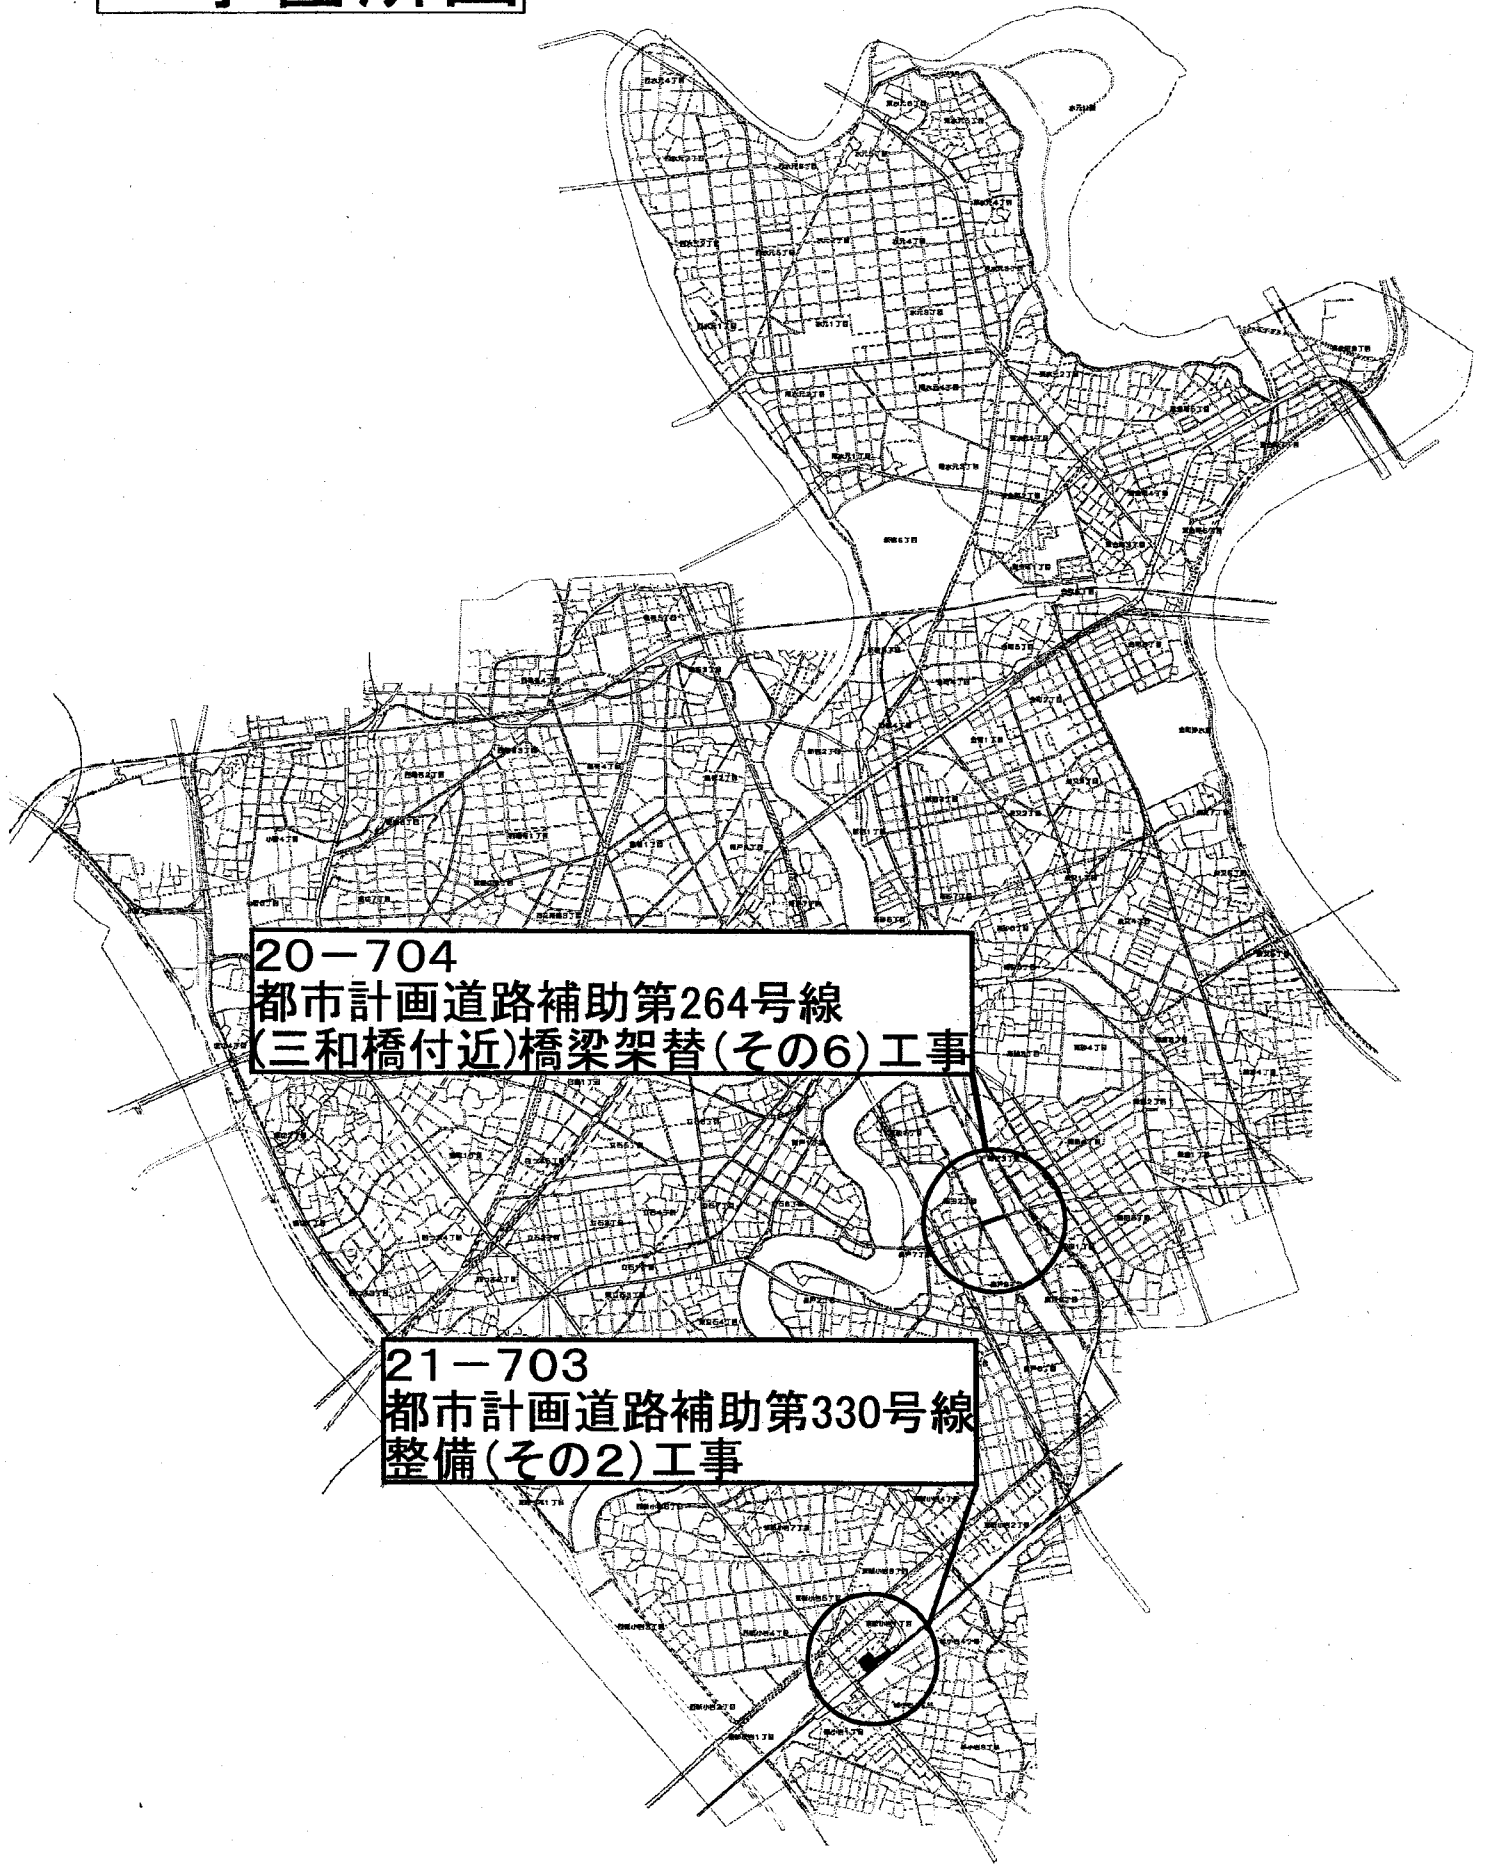

20-704
都市計画道路補助第264号線
(三和橋付近)橋梁架替(その6)工事

21-703
都市計画道路補助第330号線
整備(その2)工事
