

資 料
No. 2
都市整備部

平成24年3月13日

古隅田川緑道整備事業について

1 事業概要

足立区と葛飾区の区境付近に位置する古隅田川は、平成5年4月12日締結の「古隅田川整備に関する基本協定」に基づき、両区がそれぞれ4つの工区を分担し、整備事業を実施してきたところである。これにより、8箇所の工区のうち7箇所は平成11年度までに概ね整備が完了したものの、残る1箇所（VI工区 延長546m）については蓋架け水路の上に設置された自転車駐車場移転等の問題から、整備に着手できない状況が続いていた。

このような中で、平成21年度には足立区において「綾瀬地区自転車駐車場整備計画」が策定され、古隅田川VI工区における自転車駐車場の段階的な廃止が可能となったため、平成22年度にC区間の整備工事に着手した。


2 スケジュールの変更について

A区間及びB区間については、C区間に引き続き平成24年度以降に工事着手する予定であった。しかし、蓋掛け水路上にある自転車駐車場の受け皿として足立区が駅周辺に設置する自転車駐車場のうち、「綾瀬西自転車駐車場」や「ふげんじ自転車駐車場」の整備は完了したものの、JR高架下の「綾瀬東自転車駐車場」は鉄道事業者の高架橋耐震補強工事の遅れにより、整備の日程に変更が生じることについて足立区から協議があった。これにより、本区が計画どおりに道路整備を進めた場合、綾瀬駅から離れた「綾瀬西自転車駐車場」を当面の受け皿とせざるをえなくなり、区民の皆さんの利便性の低下を招くことや周辺地域に放置自転車が発生することが懸念される。このため、平成24年度に着手する予定であったA区間の道路整備を一旦見合わせ、足立区所管の自転車駐車場の整備日程に合わせて、道路整備事業を実施する。これにより、VI工区的全線開通予定年度を当初目標であった平成27年度から平成29年度に変更する。

3 これまでの経過

- ・平成5年4月 「古隅田川整備に関する基本協定」締結
- ・平成11年度末 8箇所の工区のうち7箇所の工区で事業完了
- ・平成21年度 足立区において「綾瀬地区自転車駐車場整備計画」策定
- ・平成22年度 C区間の工事着手（平成24年3月末完了予定）


区 間		23年度	24年度	25年度	26年度			27年度			28年度			29年度		
					4月~7月	8月~11月	12月~3月									
A区間	A-1区間				←→											
	A-2区間									←→						
B区間	B-1区間									←→						
	B-2区間												←→			
C区間		←→		H24年3月末整備完了予定												
綾瀬東自転車駐車場 (定期3523台 一時350台)					←→			開設								

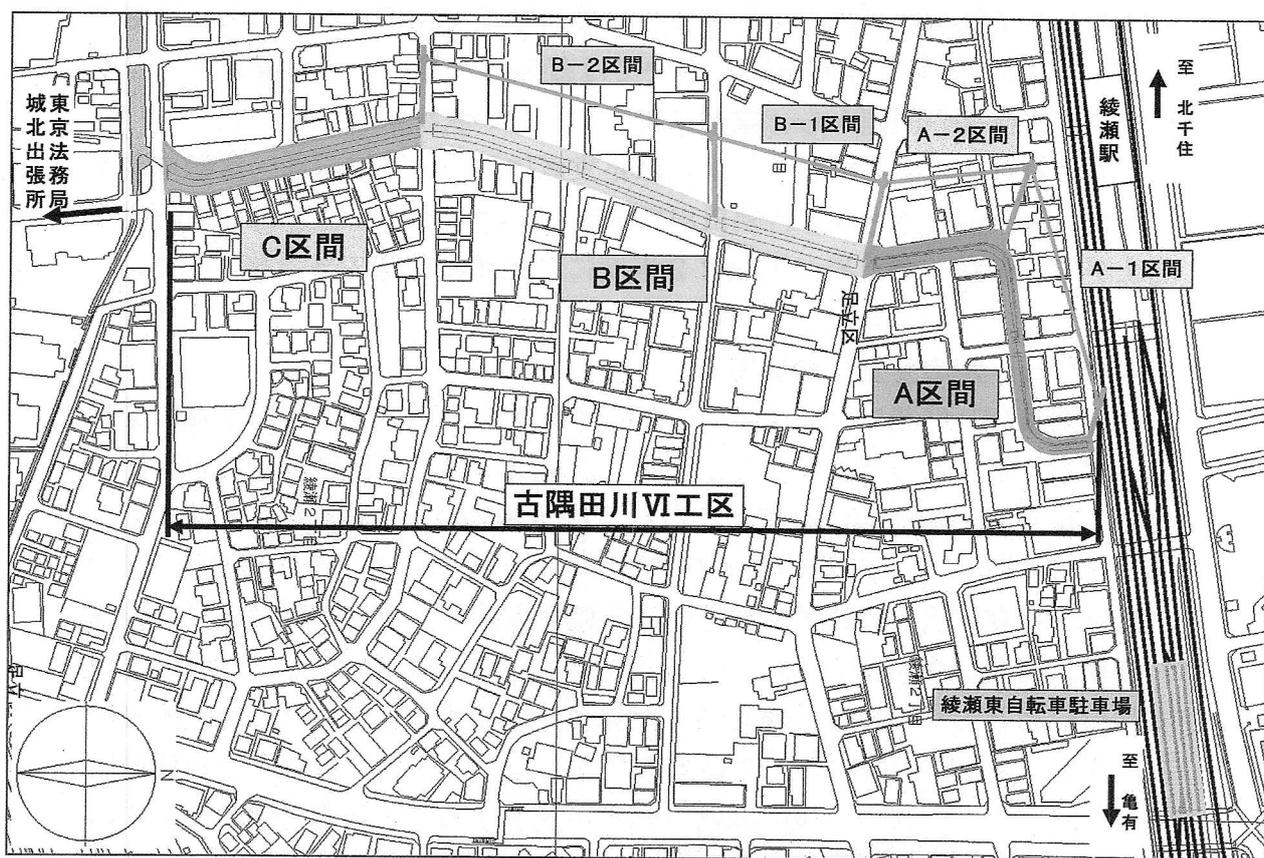

整備イメージ (B区間・C区間)



整備イメージ (A-1区間)

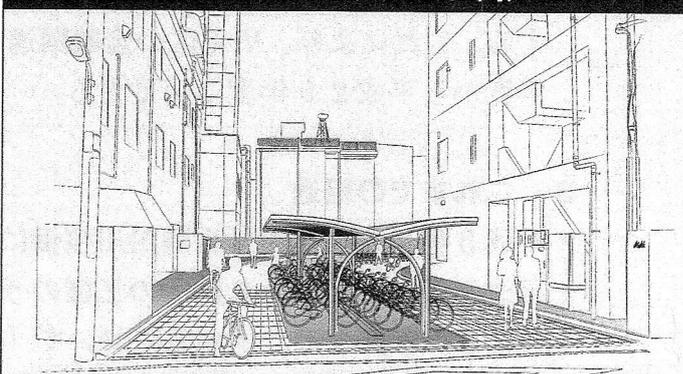

(注) 自転車駐車場の整備イメージは、足立区との打ち合わせにより変更となる場合があります。
