平成２２年度 主要工事進捗状況

（平成２３年２月２８日現在）

工事番号	工事件名	工事箇所	契約金額	契約者	工期	出来高	主な工種の進捗状況
平成20年度 第７０４号	都市計画道路補助第264号線（三和橋付近）橋梁架替（その６）工事	細田二丁目　2番先から 細田三丁目　2番先まで	803,250,000	㈱フジタ	H20.10.20 H23. 4.13	91.4 %	1) 準備、片付工　50.0 % 2) 作業ヤード整備工　82.8 % 3) 作業構台設置撤去工　100.0 % 4) 人道橋撤去工　100.0 % 5) 車道橋撤去工　94.1 % 6) 橋台工　51.0 %
平成21年度 第７０３号	都市計画道路補助第330号線整備（その２）工事	東新小岩一丁目18番先から 東新小岩一丁目 7番先まで	251,362,650	大林道路㈱	H21.10.5 H23. 3.16	99.0 %	1) 準備、片付工　97.5 % 2) 電線共同溝工　100.0 % 3) 排水施設工　100.0 % 4) 舗装工　100.0 % 5) 交通安全施設工　100.0 % 6) 植栽工　100.0 %
平成22年度 第１号	新宿六丁目公園（仮称）新設（その２）盛土工事	葛飾区新宿六丁目３番	200,035,500	成和建設㈱	H22.6.24 H23.2.21	100.0 %	1) 準備工　100.0 % 2) 盛土工　100.0 % 3) 仮設工　100.0 % 4) 撤去工　100.0 % 5) 片付工　100.0 %

資料
No. 5
都市整備部
平成23年3月15日

工事箇所図

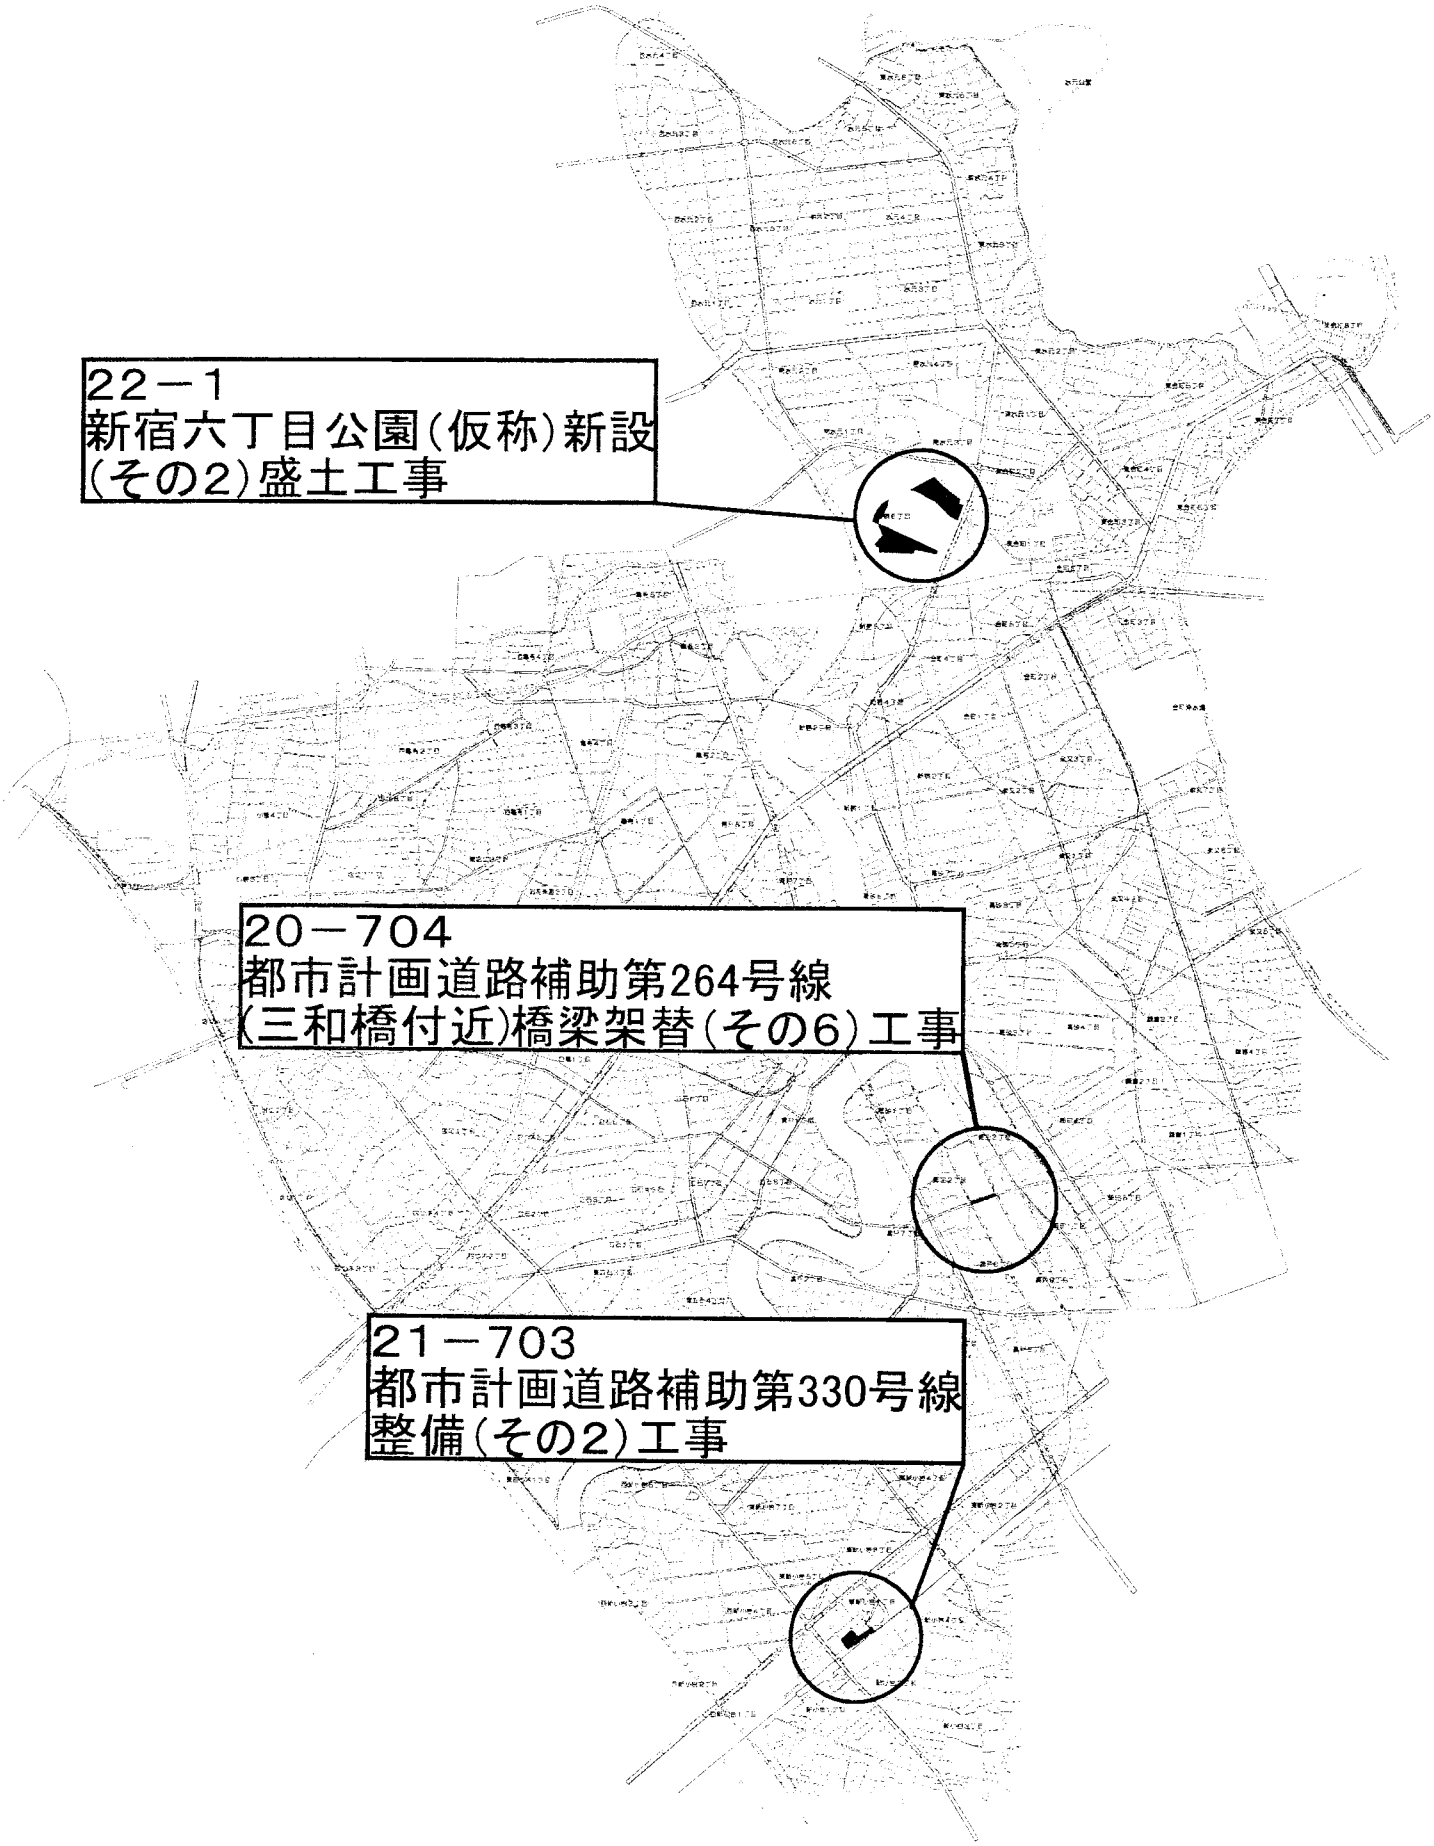
22－1
新宿六丁目公園(仮称)新設
(その2)盛土工事
20－704
都市計画道路補助第264号線
(三和橋付近)橋梁架替(その6)工事
21－703
都市計画道路補助第330号線
整備(その2)工事
