平成２３年度 主要工事進捗状況

（平成２３年５月３１日現在）

工事番号	工事件名	工事箇所	契約金額	契約者	工期	出来高	主な工種の進捗状況	
平成22年度 第７１２号	都市計画道路補助第264号線 （三和橋付近）橋梁架替 （その８）工事	細田二丁目２番先から 細田三丁目１番先まで	207,000,000	㈱エムテック 東京支店	H23.3.2 H24.6.6	1.9 %	1）準備・片付け工 2）橋脚躯体拡幅工 3）工場桁製作 4）上部架設工 5）床版工 6）上部仕上げ工 7）街路灯工	1.8 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

資料 No.11 都市整備部

平成23年6月16日

主要工事施工箇所図
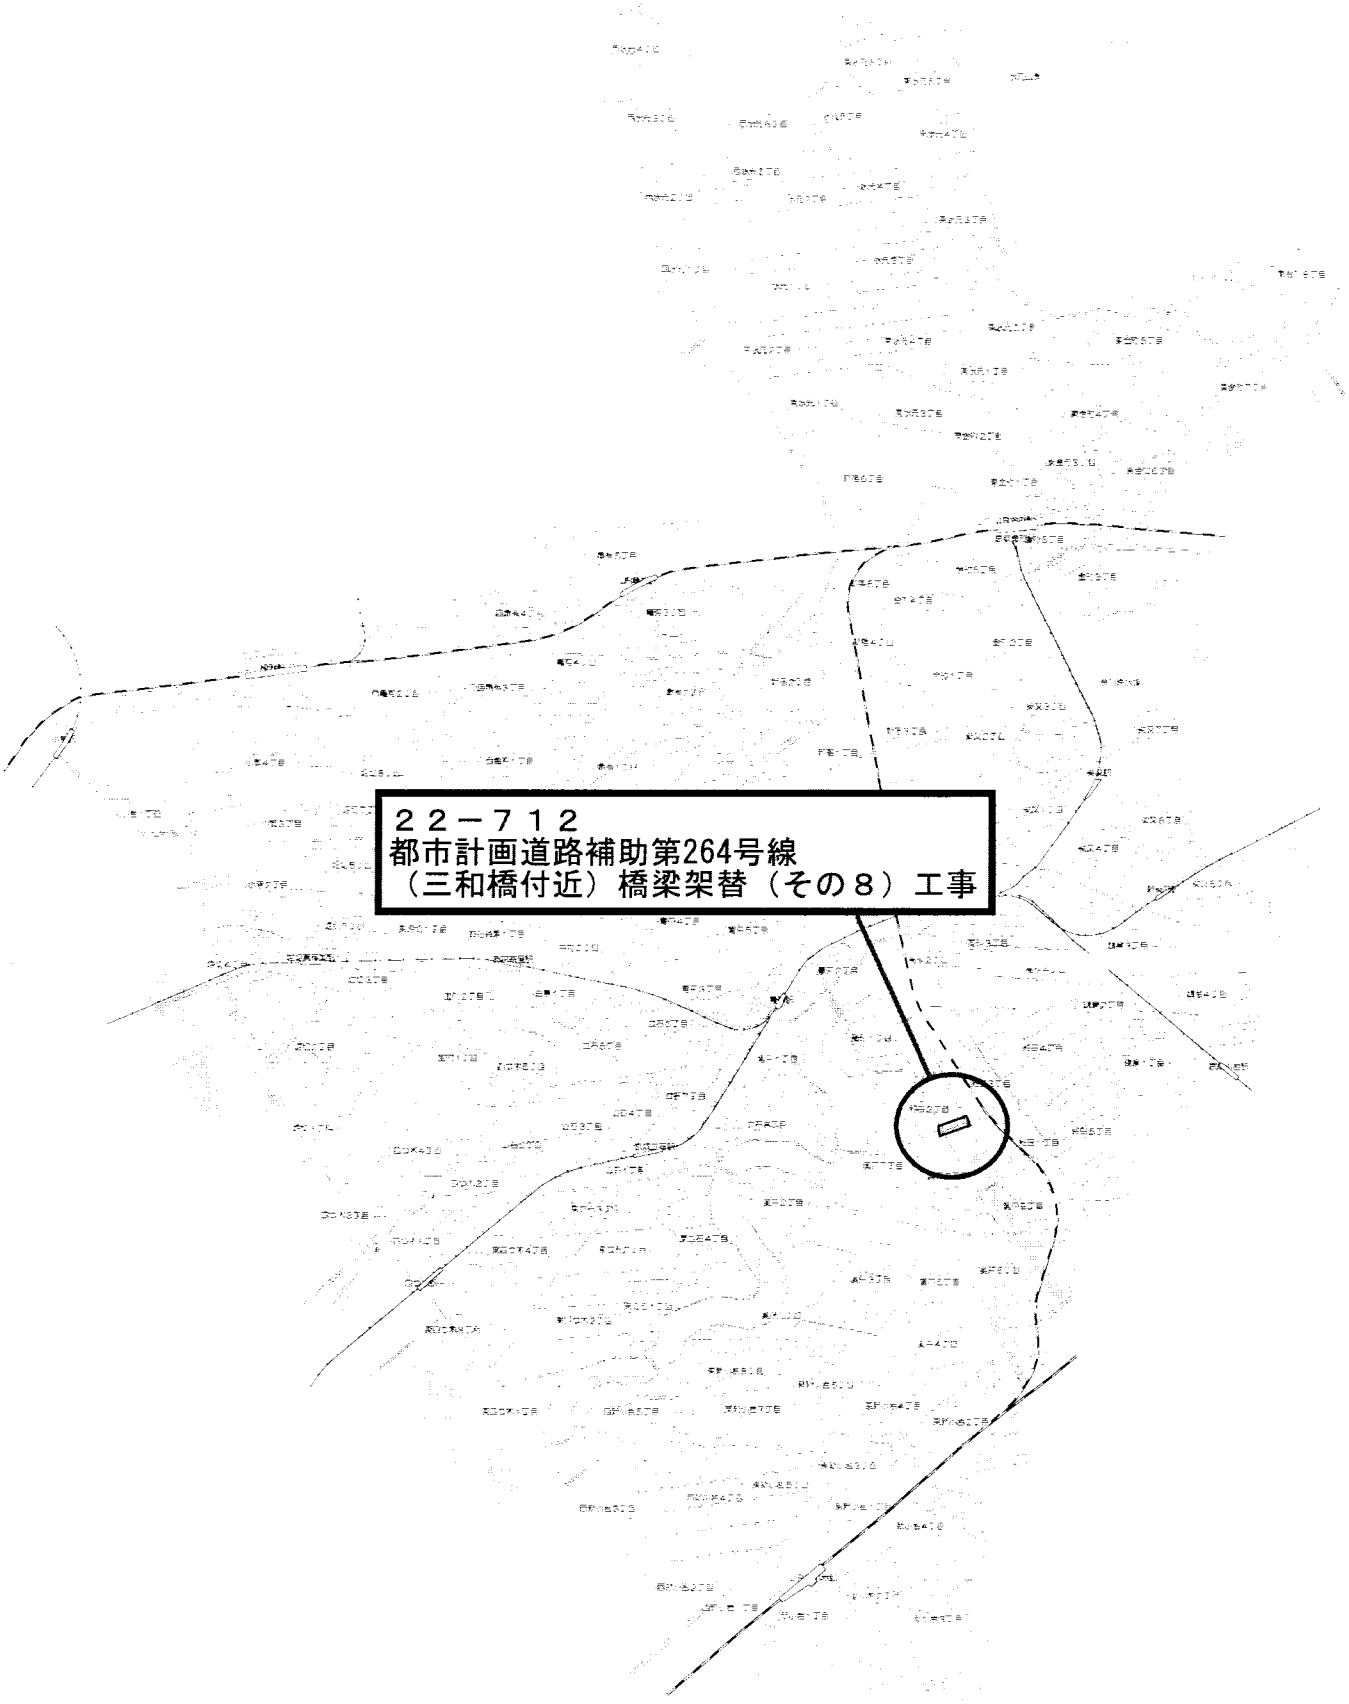
平成23年5月末現在
